浦船橋橋梁修繕工事　工事概要

工事概要

工事名	平成28年度防災・安全交付金(橋梁修繕)事業（－）舘山寺弁天島線(浦船橋) 橋梁修繕工事
工事課所	浜松市西区村櫛町地内
工事期間	平成２９年４月～平成２９年１０月末　　８：３０～１７：００
発注者	浜松市南土木整備事務所　担当　深谷巡　電話053-457-1019
工事内容	断面補修工１式　ひび割れ補修工１式　表面保護工1020㎡　舗装工278㎡
工事業者	須山建設株式会社　担当　夏目崇史　電話053-471-3162(本社土木直通)

工程表

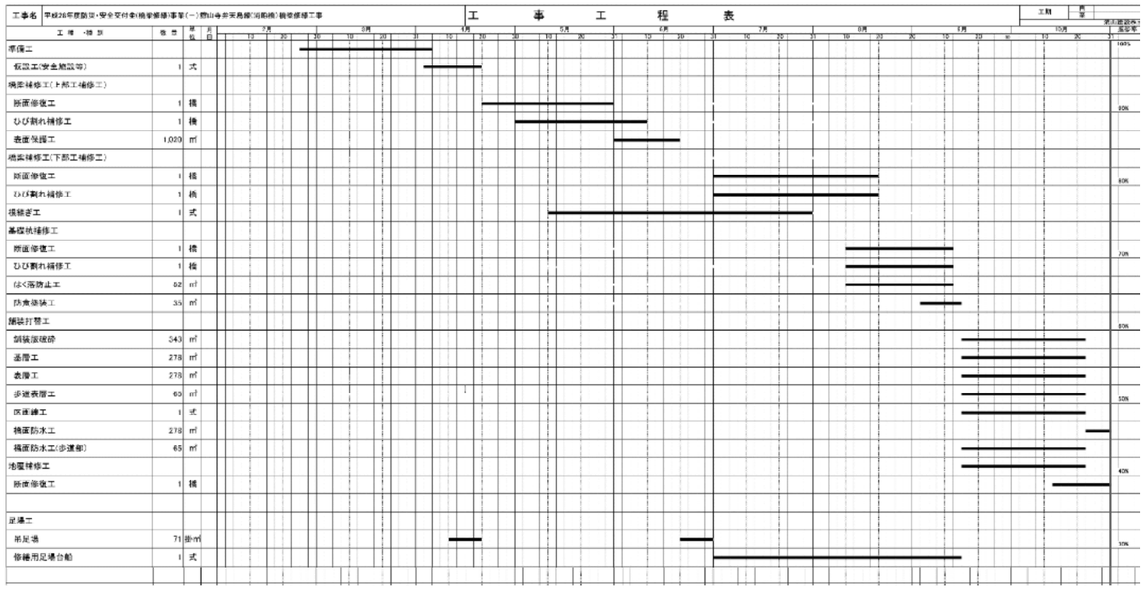

施工位置図

足場工について

イメージ写真

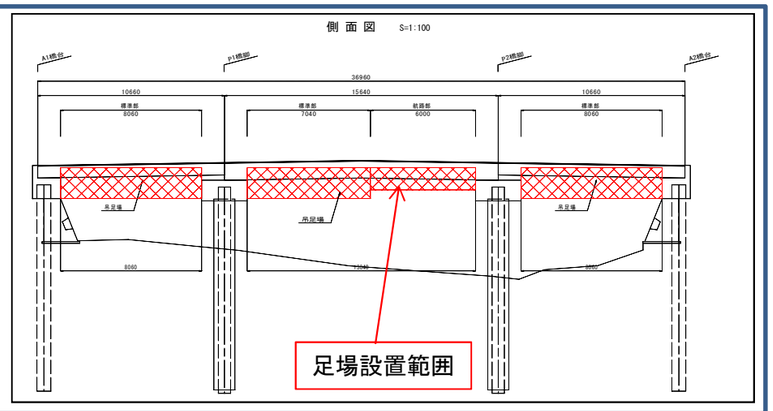

根継ぎ工について

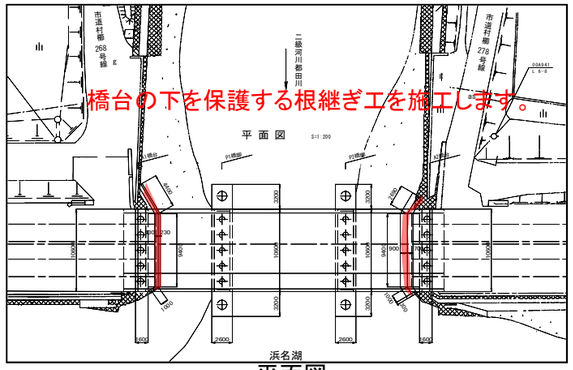

平面図

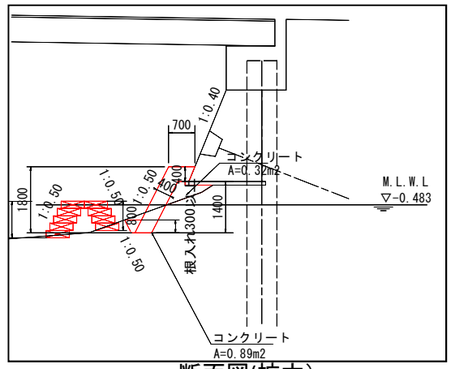

断面図(拡大)

施工の注意事項

(1)施工中は橋梁部分の道路で片側交互通行規制を行います。

(2)工事期間中の休暇は日曜日となります。(ゴールデンウィークは休工とします。)

(3)吊足場の施工について

・足場設置完了後床面にｼｰﾄを設置し飛来落下防止を行います。

・足場には船舶接触防止対策として赤色系の点滅灯を設置します。また釣り足場の側面に注意喚起の横断幕を設置します。

吊足場の下を通過する場合は十分に注意をして通行お願いします。

*注意喚起横断幕ｲﾒｰｼﾞ

(4)監視船について

航路上を施工するときは上手と下手に監視船を配置し作業を行います。
